



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

UFFICIO DI SUPPORTO - SEGRETERIA

Al Sig. Sindaco

Comune di Monza

Pec: monza@pec.comune.monza.it

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 62/2024/ GEST.

Si trasmette la deliberazione in oggetto, emessa da questa Sezione regionale di controllo, con richiesta di farne pervenire copia agli organi in indirizzo.

Il Funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

**ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI MONZA
CONTROLLO SULLA GESTIONE**
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

DELIBERAZIONE n. /2025/GEST



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE: SUSANNA LOI

RELATORE: MAURA CARTA

I funzionari:

GIULIA MILANI

GIUSEPPE PRO



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Susanna Loi | Presidente |
| Mauro Bonaretti | Consigliere |
| Vittoria Cerasi | Consigliere |
| Maura Carta | Consigliere (relatore) |
| Marco Ferraro | Primo Referendario |
| Rita Gasparo | Primo Referendario |
| Francesco Liguori | Primo Referendario |
| Valeria Fusano | Primo Referendario |
| Adriana Caroselli | Referendario |
| Iole Genua | Referendario |
| Alessandro Mazzullo | Referendario |

Nell' adunanza pubblica del 12 marzo 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull'impiego delle risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);

VISTA la deliberazione SRCLM/45/2024/INPR con la quale sono stati definiti gli obiettivi della programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2024;

VISTA la nota del 16 dicembre 2024, Prot. Cdc n.23664, con la quale il Comune di Monza ha trasmesso i dati sullo stato di attuazione del PNRR in riscontro alla nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 18 novembre 2024;

VISTA l'ordinanza n. 59 del 27 febbraio 2025 con la quale il Presidente ha fissato l'adunanza pubblica;

VISTA la nota istruttoria e i documenti trasmessi il 7 marzo 2025 prot. n. 3148;

SENTITI per il Comune di Monza la Dott.ssa Michela Romano, Alta Specializzazione Struttura PNRR Progettazione europea e il Dott. Guido Ferraro Presidente Organo di Revisione;

UDITO il relatore, Maura Carta

DELIBERA

di approvare la relazione avente ad oggetto "Attuazione del PNRR del Comune di Monza, controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77".

La presente deliberazione e l'unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune di Monza, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione del Comune.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

Il Relatore
(Maura Carta)

Il Presidente
(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)

ATTUAZIONE DEL PNRR
COMUNE DI MONZA
CONTROLLO SULLA GESTIONE
(EX ART.7, COMMA 7, D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77)

INDICE

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI..... | 9 |
| 1.1 | <i>Avanzamento procedurale</i> | <i>13</i> |
| 1.2 | <i>Avanzamento finanziario</i> | <i>15</i> |
| 1.3 | <i>Progetti definanziati</i> | <i>18</i> |
| 2 | TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI | 21 |
| 3 | CRITICITÀ NELL'ATTUAZIONE | 22 |
| 3.1 | <i>Aumento dei prezzi</i> | <i>22</i> |
| 4 | APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI..... | 26 |
| 5 | SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL COMUNE | 27 |
| 6 | VALUTAZIONI CONCLUSIVE | 28 |

INDICE DELLE TABELLE

| | |
|--|----|
| Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia | 10 |
| Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC | 11 |
| Tabella 3 - Avanzamento procedurale al 30 settembre 2024..... | 13 |
| Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025 | 14 |
| Tabella 5 - Rispetto del cronoprogramma..... | 14 |
| Tabella 6 - Risorse impegni in bilancio e pagamenti | 15 |
| Tabella 7 - Anticipazioni PNRR..... | 17 |
| Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Monza | 31 |

INDICE DEI GRAFICI

| | |
|--|----|
| Grafico 1 - Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC..... | 12 |
| Grafico 2 - Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase)..... | 13 |
| Grafico 3 - Avanzamento finanziario..... | 16 |

1 STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La presente relazione, in continuità con le deliberazioni della Sezione n. 254/2022/GEST e n. 43/2024/GEST, espone l'esito del monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, finanziario e fisico dei progetti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (di seguito PNC) di pertinenza del Comune di Monza, nell'ambito del controllo di gestione previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77.

La Sezione ha potuto verificare lo stato di avanzamento degli interventi di cui il predetto Comune è soggetto attuatore avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria, dei dati disponibili sulla piattaforma ReGiS e delle informazioni trasmesse dall'Organo di Revisione nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026.

Quest'ultima fonte informativa è frutto dell'adempimento richiesto ai revisori dei conti dell'ente locale dalla Sezione delle Autonomie attraverso una griglia di rilevazione somministrata agli enti che contiene informazioni aggiornate al 30 giugno 2024 per quanto riguarda l'avanzamento procedurale e fisico, e al 31 dicembre 2023 per l'avanzamento finanziario. Sono stati presi in considerazione anche i progetti interamente o parzialmente finanziati con risorse PNC.

Il 18 novembre 2024 la Sezione ha chiesto un aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti, cui ha fatto seguito una dettagliata risposta da parte del Comune, trasmessa in data **16 dicembre 2024**.

In data **30 gennaio 2025** è stata effettuata una verifica significativa su ReGiS, per acquisire ulteriori elementi informativi e in data **7 marzo 2025**, in vista dell'Adunanza pubblica, il Comune ha depositato una nota istruttoria aggiornata¹. Dal monitoraggio effettuato con la precedente delibera della Sezione, n. 43/2024/GEST, risultavano attivi **34 CUP**.

Successivamente si sono registrate variazioni e oggi i progetti da esaminare risultano **17**, in quanto:

- n. **17** CUP presenti nel monitoraggio precedente sono stati **definanziati**;
- n. **1** CUP è stato **aggiunto** e fa riferimento al **PNC** non presente nel precedente monitoraggio

¹ nota 7 marzo 2025 prot. n. 3148

- n. 1 CUP **non è stato riproposto** nel presente monitoraggio. Si tratta del CUP **B55E22001170006** “scuola primaria Rabinowitz via Magellano, predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica”, presente sulla piattaforma REGIS a gennaio 2025 e indicato nel file monitoraggio 2023 dei Revisori come **revocato**. La nota istruttoria depositata dal Comune in vista dell’Adunanza pubblica del 12 marzo 2025, prot. 3148 del 7 marzo 2025 ha chiarito che dopo la comunicazione di ammissione al finanziamento si : “...evidenziava la necessità di avere una proroga rispetto al termine del 31/12/2023 stabilito per l’aggiudicazione dei lavori... A tale nota, sono seguiti confronti interlocutori con funzionari del Ministero competente... In data 22.04.2024 con nota di prot. n. 0078410/2024 del 24/04/2024 (Allegato 3), il Ministero ci comunicava definitivamente la decadenza del finanziamento per mancata concessione di proroga. In data 04 marzo 2025 si è infine provveduto a revocare nella piattaforma cupweb.rgs.mef.gov.it il CUP B55E22001170006 (scuola primaria Rubinowicz), la cui ricevuta si allega alla presente (Allegato 4), in quanto la revoca non è stata effettuata direttamente dal Ministero competente”. Per tale progetto l’Amministrazione comunale non ha sostenuto alcuna spesa.

In sintesi, gli interventi che fanno capo al Comune di Monza sono rappresentati nella Tabella 1, aggregati per Missione.

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia

| | n. CUP | Lump Sum |
|---|-----------|----------|
| M1 - Digitalizzazione della PA | 6 | 5 |
| M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio | 3 | - |
| M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità | 7 | - |
| PNC - Piano Nazionale Complementare | 1 | 1 |
| Totale | 17 | 6 |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS.

Dei **17 progetti** identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP) 6 sono della tipologia *Lump-Sum*², e 5 si trovano nell’ambito della Missione 1 (Digitalizzazione

² Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del

della PA), mentre 1 è finanziato dal Piano Nazionale Complementare; 3 CUP si trovano nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio) e 7 nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).

Nella tabella che segue si rappresentano le fonti del finanziamento.

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC

| FONTI | M1 | M2 | M5 | PNC | Totale | % Fonti/Tot. |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Fondi PNRR | 1.788.751,00 € | 15.195.483,00 € | 21.616.301,19 € | - € | 38.600.535,19 € | 93,06% |
| Fondi FOI | - € | - € | 1.722.979,26 € | - € | 1.722.979,26 € | 4,15% |
| Fondi PNC | - € | - € | - € | 12.346,40 € | 12.346,40 € | 0,03% |
| Finanziamento Privato | - € | 49.673,81 € | - € | - € | 49.673,81 € | 0,12% |
| Risorse proprie | - € | - € | 678.983,31 € | - € | 678.983,31 € | 1,64% |
| Finanziamento - Stato | - € | 113.035,00 € | 300.271,50 € | - € | 413.307,39 € | 1,00% |
| Finanziamento Totale | 1.788.751,00 € | 15.358.192,70 € | 24.318.535,26 € | 12.346,40 € | 41.477.825,36 € | 100,00% |
| % Miss./Tot. | 4,31% | 37,03% | 58,63% | 0,03% | 100,00% | |


Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati in ReGiS al 30 gennaio 2025

La percentuale più elevata, pari a ca. il 60 per cento dei finanziamenti totali, è concentrata nella Missione 5 mentre il 37 per cento riguarda interventi della Missione 2.

In buona sostanza, il Comune di Monza risulta soggetto attuatore di fondi **PNRR** pari a **38.600.535,19 euro**, di fondi **FOI** pari a 1.722.979,26 euro, di fondi **PNC** pari a 12.346,40 euro, oltre a finanziamenti pubblici, privati e propri, per un ammontare complessivo di risorse finanziate pari a **41.477.825,36 euro**.

contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un'unica soluzione a obiettivo raggiunto e verificato.

Grafico 1 – Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC

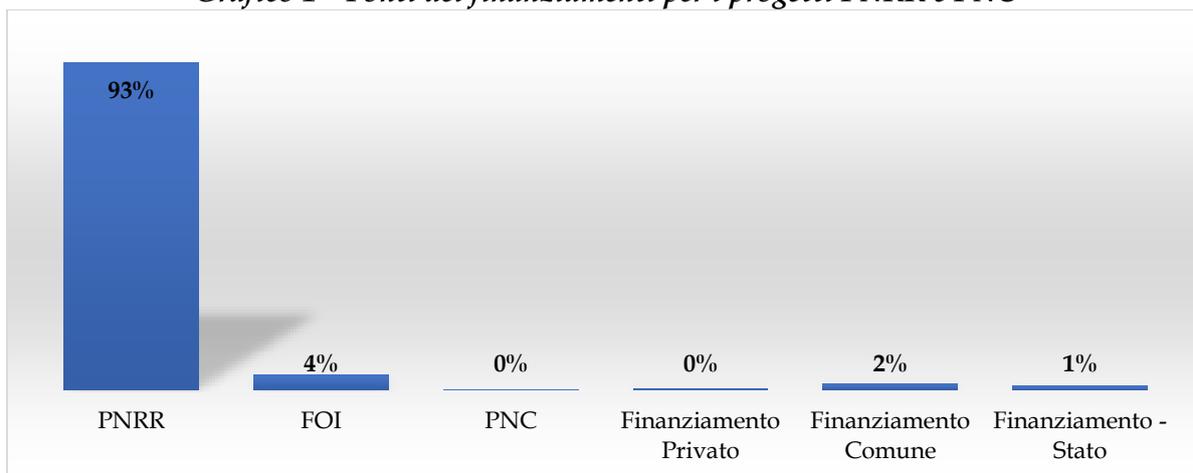

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati in ReGiS al 30 gennaio 2025

Le risorse provenienti dal dispositivo *Recovery and Resilience Facility* (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 93,06 per cento del totale, mentre quelle del Piano Nazionale Complementare (PNC) sono pari allo 0,03 per cento del totale. Il resto delle risorse proviene da fondi propri dell'Ente e dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI)³, risorse che contribuiscono con il 5,79 per cento dei fondi complessivi a cui occorre aggiungere l'1 per cento di altri finanziamenti pubblici; rimangono residuali pari allo 0,12 per cento le risorse da privati.

Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico di Progetto (CUP) si rimanda alla tabella in calce alla relazione.

*

³ Per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. DL Aiuti - decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta. Nello specifico, l'articolo 26, comma 7, del predetto DL n. 50/2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, finalizzato a consentire l'avvio entro il 31/12/2022 delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi. Allo stanziamento iniziale di complessivi 7.500 milioni di euro, sono stati aggiunti ulteriori 1.300 milioni, previsti dall'articolo 34 del DL n. 115/2022, per complessivi 8,8 miliardi di euro dal 2022 al 2027.

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili

1.1 Avanzamento procedurale

L'accertamento dell'avanzamento procedurale di ogni singolo progetto è stato eseguito al **30 giugno 2024** sulla base di quanto dichiarato dai Revisori dell'Ente nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 2024-2026.

La tabella che segue riporta lo stato di avanzamento delle procedure al 30 giugno 2024 per le diverse missioni ed illustra una situazione eterogenea.


Tabella 3 - Avanzamento procedurale al 30 giugno 2024

| FASI | M1 | M2 | M5 | PNC | Totale complessivo | % sul totale |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|
| In avvio | - | - | 2 | - | 2 | 12% |
| Aggiudicazione | - | - | 1 | - | 1 | 6% |
| Stipula contratto | 2 | 3 | 4 | - | 9 | 53% |
| Esecuzione lavori / fornitura | 1 | - | - | - | 1 | 6% |
| Conclusi | 3 | - | - | - | 3 | 18% |
| N.D. | - | - | - | 1 | 1 | 6% |
| Totale complessivo | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 100% |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati della tabella PNRR

Il grafico seguente fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.

Grafico 2 - Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase)

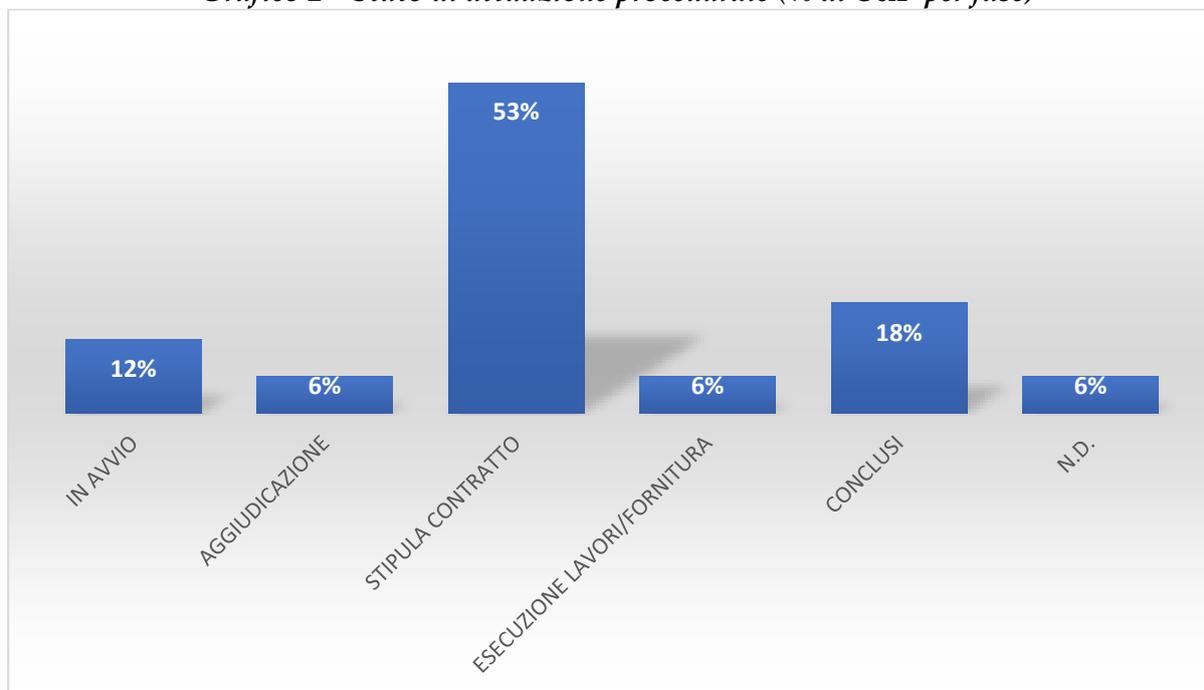

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati della tabella PNRR al 30 giugno 2024

La verifica su ReGiS alla data del **30 gennaio 2025** offre il quadro aggiornato sullo stato di avanzamento senza distinzione tra le diverse fasi e si limita a indicare i *progetti in corso di esecuzione* e quelli *conclusi*.

Tabella 4 - Avanzamento procedurale al 30 gennaio 2025

| FASE | MISSIONI | | | PNC | Totale complessivo | % sul totale |
|---------------------------|----------|----|----|-----|--------------------|--------------|
| | M1 | M2 | M5 | | | |
| In Corso | 3 | 3 | 7 | - | 13 | 76% |
| Concluso | 3 | - | - | 1 | 4 | 24% |
| Totale complessivo | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 100% |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati in ReGiS al 30 gennaio 2025

Per il dettaglio circa lo stato di **avanzamento procedurale secondo le indicazioni dei Revisori al 30 giugno 2024** di ogni singolo progetto si rimanda alla tabella in calce alla relazione.

Come noto, gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un **cronoprogramma** predefinito dal PNRR a livello nazionale, per consentire l'accertamento dei traguardi qualitativi e quantitativi (milestone e target) e favorire la tempestiva individuazione di eventuali ritardi (art. 8, co.5 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021).

Per la verifica del cronoprogramma, la Sezione ha esaminato le informazioni rilasciate dai Revisori dell'Ente nella Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026.

Tabella 5 - Rispetto del cronoprogramma

| Missione | Termini non rispettati | Termini rispettati | Totale complessivo | % CUP in linea con il cronoprogramma |
|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| M1 | 2 | 4 | 6 | 67% |
| M2 | - | 3 | 3 | 100% |
| M5 | - | 7 | 7 | 100% |
| PNC | - | 1 | 1 | 100% |
| Totale complessivo | 2 | 15 | 17 | 88% |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della Tabella PNRR al 30 giugno 2024.

Dalla Tabella si ricava che 15 CUP afferenti alle diverse missioni e al PNC rispettano puntualmente il cronoprogramma: si tratta di un risultato sopra media, in special modo per quanto attiene al 100 per cento dei progetti ricompresi nella M2 e M5.

*

1.2 Avanzamento finanziario

L'art.15 del d.l. 77/2021 ha accelerato l'avvio degli interventi PNRR ammessi al finanziamento, stabilendo che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie che sono loro attribuite su specifici capitoli di spesa sin dalla data del decreto o atto di riparto, ovvero, ancora prima che le risorse risultino impegnate dall'amministrazione centrale titolare dell'intervento.

Questa norma ha consentito di derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile contabilizzare l'accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della correlata spesa.

All'esito dell'istruttoria la Sezione ha potuto⁴ acquisire lo stato delle risorse impegnate in bilancio e lo stato dei pagamenti, così come riferiti dal Comune di Monza in sede di riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024 aggiornati secondo i dati estratti da ReGiS al 30 gennaio 2025, come emerge dalla seguente tabella.

Tabella 6 - Risorse impegni in bilancio e pagamenti

| Missione | n. CUP | Finanziamento Totale | Impegni | % impegni su totale dei finanziamenti | Pagamenti | % pagamenti su totale impegni |
|---------------------------|-----------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| M1 | 6 | 1.788.751,00 € | 613.022,08 | 34% | 598.718,08 | 97,67% |
| M2 | 3 | 15.358.192,70 € | 15.195.483,00 | 99% | - | 0,00% |
| M5 | 7 | 24.318.535,26 € | 7.942.885,02 | 33% | 2.269.257,09 | 28,57% |
| PNC | 1 | 12.346,40 € | 12.346,40 | 100% | 12.346,40 | 100,00% |
| Totale complessivo | 17 | 41.477.825,36 € | 23.763.736,50 | 57% | 2.880.321,57 | 12,12% |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati in ReGiS al 30 gennaio 2025

La tabella mostra il finanziamento totale, ovvero le risorse a disposizione del Comune di Monza per attuare i progetti del PNRR e PNC e riporta la percentuale e l'importo dei pagamenti effettuati dal Comune in relazione agli impegni assunti nel bilancio:

- per la Missione 1 risulta un livello di impegno pari a circa il 34 per cento del totale dei fondi (613.022,08 euro), seguito dal pagamento di 598.718,08, il 98 per cento delle somme impegnate;


- per il progetto finanziato da PNC le somme sono integralmente impegnate e pagate;

- per la Missione 2 risultano impegnati 15.195.483,00 pari al 99 per cento del finanziamento totale assegnato ma non risultano pagamenti;

- per la Missione 5 risultano impegnati 7.942.885,02 corrispondenti al 33 per cento dei fondi assegnati. Sono stati effettuati pagamenti per 2.269.257,09 pari al 29 per cento delle risorse impegnate e tale dato si spiega avendo riguardo alla natura delle opere realizzate per tali linee di finanziamento le quali, diversamente da quelle della Missione 1 e del PNC, richiedono tempi di progettazione e di attuazione più significativi.

Per una migliore lettura si fornisce anche in forma grafica il dato aggiornato, specificando le percentuali di impegni sul totale del finanziamento del progetto e di pagamenti sul totale degli impegni per le diverse Missioni.

Grafico 3 - Avanzamento finanziario

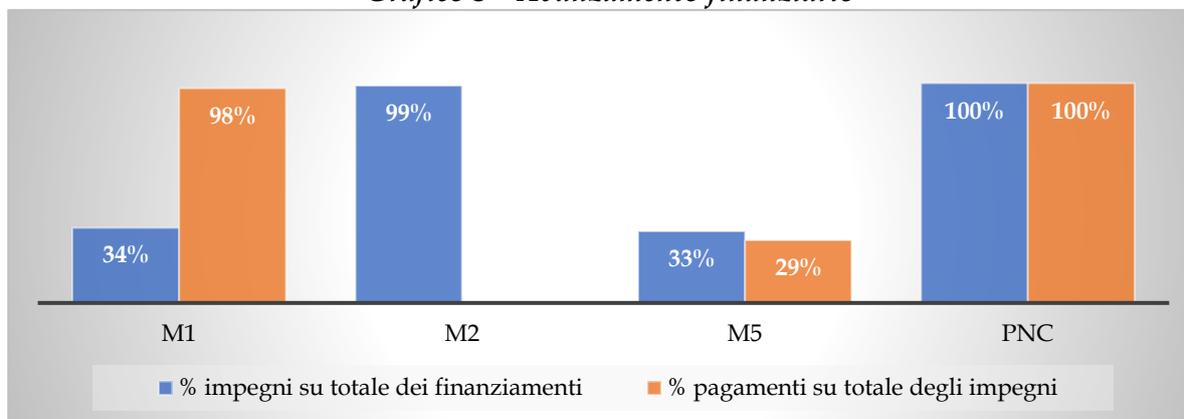

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei dati in ReGiS al 30 gennaio 2025

Per quanto concerne le **anticipazioni**, va osservato che il PNRR ha previsto che l'avvio dei progetti precede il finanziamento ma, per gli enti privi di capienza finanziaria e di risorse insufficienti per avviare gli investimenti, l'art. 9, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 152 del 2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", aveva previsto la possibilità di disporre di anticipi di liquidità,

nella misura del **10 per cento** delle risorse complessive assegnate, su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale, da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.⁵

Nel tempo sono intervenute ulteriori modifiche del quadro normativo finalizzate a velocizzare i flussi finanziari del PNRR: l'art. 18-quinquies "disposizioni finanziarie in materia di PNRR" del d.l. n. 113/2024 (conv. con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) ha previsto che "le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo **del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR...**".

Per l'attuazione di questa previsione è stato adottato il decreto MEF del 6 dicembre 2024 recante "Criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 4 gennaio 2025, i cui effetti potranno essere apprezzati nel successivo monitoraggio.

Attualmente la Sezione è in grado di esporre lo stato delle anticipazioni erogate al Comune di Monza, con le seguenti precisazioni.

I dati riportati nella **tabella 7** si riferiscono a diverse soglie temporali: per l'anticipazione concessa dalle amministrazioni titolari e i successivi pagamenti i dati sono riferiti al **31 dicembre 2023**, sulla base di quanto riportato nella Tabella PNRR dei Revisori, mentre le informazioni sull'importo complessivo del finanziamento PNRR, sugli impegni iscritti a bilancio e sul fondo pluriennale vincolato di spesa sono aggiornate al **30 giugno 2024**.

Tabella 7 - Anticipazioni PNRR

| MISSIONE | CUP | PNRR | Anticipazioni e PNRR | % Ant.ne/ PNRR | Impegni a valere su risorse PNRR e/o PNC | FPV di spesa attivato per erogazione anticipazione PNRR | Pagamenti PNRR e/o PNC al 31/12 |
|----------|-----|-----------------|----------------------|----------------|--|---|---------------------------------|
| M1 | 6 | 1.788.751,00 € | 34.000,00 € | 2% | 469.207,24 € | - € | 255.106,20 € |
| M2 | 3 | 15.195.483,00 € | 2.294.998,00 € | 15% | - € | 2.294.998,00 € | - € |
| M5 | 7 | 21.616.301,19 € | 1.981.830,12 € | 9% | 610.798,64 € | 1.712.109,12 € | 425.903,35 € |
| PNC | 1 | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

⁵ La contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso decreto, "per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR".

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Totale complessivo | 17 | 38.600.535,19 € | 4.310.828,12 € | 11% | 1.080.005,88 € | 4.007.107,12 € | 681.009,55 € |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

Fonte: elaborazione Corte dei conti sulla base della Tabella PNRR del 30 giugno 2024

Come si ricava dalla tabella, per la Missione 1 è stata corrisposta un'anticipazione di 34.000,00 euro, pari al 2 per cento dell'importo finanziato (1.788.751,00), per la Missione 2 un'anticipazione di 2.294.998,00 euro pari al 15 per cento dei fondi assegnati (15.195.483,00 euro) per la Missione 5 l'importo di 1.981.830,12 euro pari al 9 per cento delle risorse assegnate (21.616.301,19 euro).

La percentuale dell'11 per cento complessiva è stata calcolata tenendo conto dei finanziamenti per tutti i 17 CUP elencati dai Revisori (con esclusione del PNC non presente nel monitoraggio).

Risultano, alla data del 31 dicembre 2023, pagamenti non superiori alle anticipazioni erogate.

*

1.3 *Progetti definanziati*

La versione iniziale del PNRR (approvata dal Consiglio della UE del 13 luglio 2021) è stata oggetto finora di quattro modifiche⁶.

La più rilevante è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 ed è stata approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023 con una rimodulazione e un incremento di 2,9 miliardi dei fondi UE a favore dell'Italia (attualmente pari a 194,4 miliardi) con l'inserimento della nuova Missione 7 (RePowerEU) ed altre modifiche alle misure originariamente previste. Queste ultime sono divenute necessarie per criticità di natura oggettiva dovute principalmente all'aumento dei costi, alla scarsità di materiali, ai limiti del sistema produttivo⁷.

⁶ la prima modifica, nel luglio 2023 è stata approvata dal Consiglio UE del 19 settembre 2023, ha riguardato milestones e targets (M&T). La seconda è stata richiesta dal Governo ad agosto 2023 e approvata dal Consiglio della UE l'8 dicembre 2023. La terza modifica, richiesta dal Governo il 4 marzo 2024 è stata approvata dal Consiglio della UE il 14 maggio 2024 (correzione di 55 errori materiali). La quarta modifica è stata richiesta dal Governo il 10 ottobre 2024 e approvata dal Consiglio della UE il 12 novembre 2024

⁷ La problematica è diffusamente esaminata nella nota di lavoro 2/2024 - la riforma del codice dei contratti e la rimodulazione del PNRR - Ufficio parlamentare del bilancio dicembre 2024

Dopo la revisione del PNRR, approvata con decisione del Consiglio dell'UE dell' 8 dicembre 2023, alcune misure sono state de-finanziate totalmente o parzialmente, ovvero sono state sostituite le fonti del finanziamento con fondi statali o di altra fonte europea.

Il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, convertito nella legge 29 aprile 2024, n. 56, all'art. 1 ha riconosciuto l'esigenza di recuperare le necessarie risorse finanziarie per coprire il fabbisogno necessario per assicurare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano.

La predetta normativa ha *salvaguardato i progetti con obbligazioni giuridicamente vincolanti*, vale a dire quelli per i quali vi sia stata l'assunzione dell'impegno contabile ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 oppure nei casi di stipula del contratto.

La norma ha, inoltre, previsto che, dopo l'individuazione degli interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento, nell' ipotesi di mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano rese indisponibili le relative risorse.

Il quadro generale dei definanziamenti e rifinanziamenti è riportato in modo dettagliato nell'art. 1, comma 8 del DL 19/2024: è previsto lo stanziamento delle ingenti risorse nazionali necessarie per la copertura finanziaria dei progetti definanziati ovvero parzialmente fuoriusciti dal PNRR.

Il 29 ottobre 2024, su richiesta del Governo, la Commissione ha assentito alcune ulteriori proposte di modifica al PNRR italiano, rispetto alla revisione più ampia dell'8 dicembre 2023; le stesse sono state poi approvate dal Consiglio europeo il 18 novembre 2024.

Sullo sfondo di tale inquadramento normativo si riferisce dei progetti che i Revisori del Comune di Monza hanno elencato come definanziati totalmente o parzialmente.

Dall'istruttoria è emerso che nel Comune di Monza sono stati totalmente definanziati 17 CUP per un totale, risultante dalla precedente deliberazione 43/2024/GEST, di euro 4.412.233,65 tutti ricompresi nella M2.

Dei 17 progetti dichiarati defianziati, n. 11 risultano conclusi mentre n. 2 sono indicati nella fase in corso; risultano cancellati da ReGiS n. 3 progetti mentre l'ultimo è indicato come da annullare.

Per i 16 progetti realizzabili sono indicati gli importi della fonte di finanziamento sostitutiva: tutte le opere sono state realizzate o sono in corso di realizzazione con i fondi del bilancio dello Stato Piccole Opere L. 160/2018 - Decreto Crescita e Medie Opere l. 145/2018 DM 8.11.21.

2. TEMPI DI RIMBORSO DA PARTE DEI MINISTERI

Come sopra rilevato, l'art. 1 del D.M. MEF del 6 dicembre 2024 ha previsto la possibilità di anticipazioni fino al 90% e disposto che *“A fronte delle erogazioni effettuate ai sensi del presente decreto, le amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati dei trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori”*.

La verifica al 30 gennaio 2025 non ha consentito di apprezzarne gli effetti che saranno accertati nel prossimo monitoraggio e gli aggiornamenti sui tempi di rimborso fanno riferimento agli esiti dell'istruttoria condotta dalla Sezione.

Dal riscontro istruttorio dell'Ente al 16 dicembre 2024 è emerso che :

- per n. 4 progetti ricompresi nella Missione 1 sono state trasmesse le asseverazioni, seguite dall'erogazione del finanziamento. Per altri 2 progetti pur avendo trasmesso la prescritta documentazione non ha ancora avuto luogo alcun pagamento;
- per gli interventi della Missione 2 non è stato ancora presentato alcun rendiconto;
- per gli interventi della Missione 5 sono stati presentati n. 6 rendiconti per i quali il Comune dichiara di aver ricevuto il rimborso.

Nel riscontro istruttorio del 16 dicembre 2024, l'Ente non ha riportato il tempo massimo di *“ritardo”* nei trasferimenti ministeriali.

3. CRITICITÀ NELL'ATTUAZIONE

Il Comune di Monza nell'articolata risposta istruttoria del 16 dicembre 2024 ha sostanzialmente evidenziato che nelle schede inviate dai Revisori non sono state riscontrate criticità in merito ai CUP dei progetti in corso di realizzazione o realizzati e che altre problematiche sono state risolte con un adeguato monitoraggio e con interlocuzioni con le amministrazioni titolari.

In particolare, per il CUP B51F23001270001, finanziato con fondi PNC, è stato rilevato che *“... nel caso dell'integrazione delle liste elettorali in ANPR, non essendo una misura finanziata con fondi PNRR, ma con fondi PNC, essa non viene rendicontata su Regis tramite PADigitale2026, ragione per cui non trova la candidatura tracciata su Piattaforma tramite CUP dedicato. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e comunque incaricato a seguire la rendicontazione, ma seguendo una procedura diversa e per tale ragione il sistema Regis non deve essere alimentato dagli enti”*. Pur in assenza di uno specifico obbligo in tal senso, l'Ente ha provveduto a tracciare a posteriori tutti i flussi finanziari connessi al progetto.

*

3.1. Aumento dei prezzi

Tra le criticità rilevate in sede di attuazione del PNRR vi è stato il significativo e progressivo **incremento dei prezzi**.

Il contesto geopolitico ed economico internazionale ha, da tempo, intensificato tensioni nei prezzi dei beni energetici e determinato spinte inflazionistiche i cui effetti si sono riverberati significativamente sulla dinamica delle spese nei diversi settori produttivi. Poco tempo dopo l'approvazione del PNRR, nella consapevolezza del costante incremento dei prezzi, il Governo ha introdotto il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - FOI, con il DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022.

Successivamente, per fronteggiare l'aumento dei costi e favorire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, nel secondo semestre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto 11 luglio 2023 per l'assegnazione di ulteriori risorse al fine di consentire l'affidamento dei lavori con prezzi adeguati ai rincari.

Il primo monitoraggio sull'aumento dei prezzi per i progetti finanziati dal PNRR è stato effettuato dalla Banca d'Italia nella relazione del maggio 2023 evidenziando che *"In relazione all'aumento dei prezzi di materie prime e materiali da costruzione, si stima che alla fine del 2022 il costo dei progetti inclusi nel Piano era cresciuto in media di circa il 10 per cento rispetto a quanto inizialmente preventivato."*⁸.

Dati e documenti più dettagliati sono stati elaborati dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, che nella Relazione del novembre 2023 ha affermato che *"...Guardando il dato aggregato, ponderato in base al peso della spesa associata agli interventi, si può stimare che con l'attuale livello dei prezzi l'aumento di prezzo ponderato per la produzione dei beni e servizi nell'ambito del PNRR sia nell'ordine del 10,7 per cento..."*⁹.

La successiva Relazione sul PNRR al Parlamento del maggio 2024 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti sottolinea come *"..In circa un terzo dei casi, le scelte di rifinanziamento riguardano iniziative di investimento per le quali le modifiche hanno trovato giustificazione nell'aumento dei costi stimati a causa dell'inflazione; in altrettante ipotesi le ragioni alla base dei rifinanziamenti sono riscontrabili nell'esigenza di attuare alternative migliori per conseguire il medesimo livello di ambizione originariamente fissato ovvero in cambiamenti nella domanda di mercato.."*.

Sullo sfondo di queste problematiche si espongono le difficoltà incontrate dal Comune di Monza per i seguenti CUP:

- B59J21026160005 - Progetto di riqualificazione quartiere Bramante - Via Bramante da Urbino - progetto di riqualificazione (13.161.301,19 euro) su cui si sono registrati aumenti dei prezzi;
- B14H22000830006 - Realizzazione di centri servizi (stazioni di posta) per il contrasto alla povertà (1.090.000,00 euro) sui cui il Comune segnala maggiori costi di investimento del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ulteriore incremento del valore complessivo delle opere

⁸ Lo stato di attuazione del PNRR in Banca d'Italia, Relazione annuale sul 2022

⁹ Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo - novembre 2023 - Relazione sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) redatta ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Il Comune ha segnalato per tali progetti un incremento dei prezzi e conseguente variazione del valore complessivo delle opere, anche se non è stata riportata una quantificazione del maggior costo e le risorse con cui farvi fronte. Invitata a chiarimenti sul punto, nella nota istruttoria del 7 marzo 2025 l'Amministrazione ha precisato che:

- per il CUP **B59J21026160005** (rientrante nel Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare - PinQua), la rimodulazione dell'importo, che passa dal valore iniziale di progetto pari a 13.785.556,00€ (13.161.301,19 euro finanziati con risorse PNRR e 624.254,81 euro co-finanziati dal Comune di Monza e da ALER), al valore finale pari a 15.508.535,26 euro per aumento dei prezzi, tiene conto delle **ulteriori risorse pari a 1.722.979,26€ assegnate con Decreto del MEF N. 187**, a seguito di ammissione dell'intervento al **Fondo opere Indifferibili (FOI)**, II semestre 2023. L'attuale Quadro Economico dell'intervento è stato trasmesso al Ministero competente, con prot. n. 0219000/2023 dell' 11 dicembre 2023 con l'indicazione del valore complessivo pari a 15.508.535,26 euro;
- per il CUP **B14H22000830006** Stazioni di Posta, la rimodulazione dell'importo di progetto, che passa dal valore iniziale pari a 1.090.000€ (suddiviso fra costi di investimento per 910.000,00€ e costi di gestione per 180.000,00€) al valore finale pari a 1.455.000,00 €, tiene conto di un **incremento dei soli costi di investimento pari a 355.000,00€ (200.000,00€ +155.000,00€)**, come di seguito specificato:
 - o Con DG Comunale n. 242 del 27/07/2023 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) che ha definito la conformazione dei manufatti rispetto all'obiettivo sociale ad esso associato, in base al quale il valore complessivo delle opere è stato definito per **un maggior costo di investimento pari a 200.000€ (Allegato 6)**, coperto con **fondi propri di bilancio**, stanziati con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 13/06/2023;

- con DG Comunale n. 73 del 29 febbraio 2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) per l'appalto integrato e approvato il Quadro Economico d'investimento per un'ulteriore spesa pari a **155.000,00 €**, coperta con **fondi propri di bilancio**, stanziati con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27 giugno 2024.

4. APPLICAZIONE DELLE NORME CONTABILI

Relativamente alla puntuale applicazione delle norme contabili il Comune di Monza ha rappresentato che:

- è stato costituito il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in entrata e in spesa a fronte di una quota del finanziamento PNRR incassata dall'ente sotto forma di anticipazione distinguendo i casi a seconda che l'incasso sia avvenuto nel 2022 o nel 2023, così come specificato nella FAQ n. 48/2021 della Ragioneria Generale dello Stato (art. 2 D.M. 11ottobre 2021);
- ha proceduto per ciascun progetto alla tracciabilità dei capitoli, nonché degli accertamenti impegni e reversali/ mandati, come previsto dalla normativa vigente.

5. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL COMUNE

Relativamente alla governance del PNRR è stato confermato quanto evidenziato nella precedente delibera della Sezione n. 254/2022 in ordine alla costituzione di una struttura dedicata al PNRR con l'attribuzione di un incarico a tempo determinato e pieno, ad una figura di Alta Specializzazione, ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura della posizione a tempo pieno e determinato nel profilo professionale di "Esperto/a in finanziamenti/fondi PNRR.

Oltre alla consolidata struttura di monitoraggio e coordinamento dei progetti PNRR è stato segnalato che, in data 8 gennaio 2024, è stata assunta una risorsa specialistica a tempo parziale e determinato con qualifica di Funzionario specialista tecnico assegnata ad un progetto finanziato da fondi PNRR.

La Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria e i chiarimenti resi nell'Adunanza Pubblica, dai quali è emerso che 15 CUP su 17 rispettano puntualmente il cronoprogramma, risultato sopra media, in special modo per il 100 per cento dei progetti ricompresi nella M2 e M5, rileva come la struttura organizzativa del Comune abbia assicurato un costante e proattivo monitoraggio e un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.

È stato precisato che nel sito web del Comune di Monza viene costantemente aggiornata la sezione dedicata PNRR, dalla quale si viene indirizzati alla pagina Attuazione Misure PNRR - Comune di Monza contenente sia le informazioni sui progetti finanziati con fondi PNRR-PNC, sia le informazioni relative all'espletamento delle gare e agli affidamenti afferenti a tali progetti.

<https://www.comune.monza.it/it/attuazione-misure-pnrr>

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'attività istruttoria di questa Sezione, sulla base delle informazioni contenute nella Tabella PNRR compilata dai Revisori dell'Ente allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 (che contiene informazioni circa dati di bilancio al 31 dicembre 2023 e sullo stato di avanzamento dei progetti al 30 giugno 2024), dei dati estratti dalla piattaforma ReGiS consultata in data 30 gennaio 2025 e dei riscontri istruttori trasmessi dal Comune in 16 dicembre 2024 e il 7 marzo 2025, si possono formulare le seguenti conclusioni:

- I. al 30 gennaio 2025 il Comune di Monza risulta **sogetto attuatore** di n. **17 progetti** identificati mediante un Codice Unico di Progetto (CUP);
- II. le **fonti del finanziamento** sono costituite da fondi **PNRR** pari a **38.600.535,19 euro**, da fondi FOI pari a 1.722.979,26 euro, da fondi PNC pari a 12.346,40 euro, oltre a finanziamenti pubblici, privati e propri, per un ammontare complessivo di **41.477.825,36 euro**;
- III. **l'avanzamento procedurale** al 30 giugno 2024, come da informazioni tratte dalla Tabella dei Revisori, evidenzia n.12 progetti nelle fasi iniziali, 1 progetto in corso di esecuzione, n. 3 progetti conclusi. Per un progetto mancano informazioni;
- IV. **l'avanzamento procedurale** su ReGiS aggiornato al 30 gennaio 2025 riporta n. 13 progetti in corso e 4 conclusi;
- V. relativamente al **cronoprogramma** al 30 giugno 2024, n. 17 CUP 15 appaiono rispettarlo e, tra questi, il 100 per cento dei progetti ricompresi nella M2 e M5;
- VI. risultano totalmente defianziati, per l'ammontare complessivo di **euro 4.412.233,65**, n. **17 CUP** tutti ricompresi nella M2. Dei progetti defianziati, n. 11 risultano conclusi mentre n. 2 in corso. L'Ente ha segnalato che tutte le opere sono state rifinanziate con i fondi del bilancio dello Stato Piccole Opere L. 160/2018 – Decreto Crescita e Medie Opere l. 145/2018 DM 8.11.21 .

- VII. **l'avanzamento finanziario** al 30 gennaio 2025 riporta gli impegni assunti nel bilancio sul totale dei finanziamenti e i pagamenti effettuati dal Comune: risultano impegnati complessivamente 23.763.736,50 euro, il 57 per cento del totale dei finanziamenti, mentre i pagamenti sono stati pari a 2.880.321,57 euro, il 12,12 per cento sul totale impegnato. Nel dettaglio, per la Missione 1 risulta un livello di impegno pari a circa il 34 per cento del totale dei fondi (613.022,08 euro), cui ha fatto seguito il pagamento di 598.718,08 euro, il 98 per cento delle somme impegnate; per la Missione 2 risultano impegnati 15.195.483,00 euro pari al 99 per cento del finanziamento totale assegnato, non seguiti da pagamenti; per la Missione 5 risultano impegnati 7.942.885,02 euro corrispondenti al 33 per cento dei fondi assegnati seguiti da pagamenti per 2.269.257,09 euro, il 29 per cento delle risorse impegnate; per il progetto finanziato da PNC le somme sono integralmente impegnate e pagate;
- VIII. quanto alle **anticipazioni** nella Tabella PNRR dei Revisori allegata al bilancio preventivo 2024-2026, per la Missione 1 risulta corrisposta un'anticipazione di 34.000,00 euro, pari al 2 per cento dell'importo finanziato (1.788.751,00), per la Missione 2 un'anticipazione di 2.294.998,00 pari al 15 per cento dei fondi assegnati (2.294.998,00 euro), per la Missione 5 l'importo di 1.981.830,12 pari al 9 per cento delle risorse assegnate (21.616.301,19). Alla data del 31 dicembre 2023 i pagamenti non hanno superato le anticipazioni erogate;
- IX. l'Ente ha **rendicontato** n. 4 progetti ricompresi nella Missione 1 e gli importi sono stati integralmente erogati. Per altri 2 progetti pur avendo trasmesso la prescritta documentazione non c'è ancora stato il rimborso; per gli interventi della Missione 2 non è stato presentato alcun rendiconto; per gli interventi della Missione 5 sono stati presentati n. 6 rendiconti seguiti da regolare rimborso;
- X. la Tabella dei Revisori al 30 giugno 2024 non riscontra **criticità** in merito ai progetti in corso di realizzazione o realizzati. Per n.2 progetti viene

segnalato un **incremento dei prezzi** e conseguente variazione del valore complessivo delle opere. I maggiori importi sono stati quantificati in sede di riscontro istruttorio del 7 marzo 2025; nell'occasione è stato rilevato che l'incremento è stato finanziato mediante risorse ministeriali, FOI e fondi propri di bilancio per 355.000,00 euro;

- XI. l'Ente ha dichiarato di attenersi alle **norme contabili** per il FPV, la registrazione dei capitoli e la tracciabilità dei finanziamenti;
- XII. non vi sono stati aggiornamenti circa la **governance del PNRR** e la Sezione, visti gli esiti dell'istruttoria e i chiarimenti resi nell'Adunanza Pubblica, dai quali è emerso che 15 CUP su 17 rispettano puntualmente il cronoprogramma, risultato sopra media, in special modo per il 100 per cento dei progetti ricompresi nella M2 e M5, rileva come la struttura organizzativa del Comune di Monza abbia assicurato un costante e proattivo monitoraggio e un avanzamento procedurale coerente con le prescritte milestone nazionali ed europee.
- XIII. per quanto riguarda la sezione dedicata al PNRR in "**Amministrazione trasparente**" l'unità organizzativa che coordina il monitoraggio degli interventi PNRR provvede con regolarità.

Tabella 8 - Elenco dei progetti PNRR e PNC del Comune di Monza

| N. | MISSIONE | CUP | DENOMINAZIONE PROGETTO | FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024) | Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024) | CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025) |
|----|----------|-----------------|--|---|---|--|
| 1 | M1 | B51C22000970007 | COMUNE DI MONZA- PORTALE WEB- SITO INTERNET - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO- PNRR- M1 C1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI*PIAZZA TRENTO TRIESTE*SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SITO COMUNALE ISTITUZIONALE CON OBIETTIVO | STIPULA CONTRATTO | Termini rispettati | In Corso |
| 2 | M1 | B51C22001460006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE*TERRITORIO COMUNALE*N.20 SERVIZI DA MIGRARE | STIPULA CONTRATTO | Termini rispettati | In Corso |
| 3 | M1 | B51F22002360006 | APPLICAZIONE APP IO*TERRITORIO NAZIONALE*ATTIVAZIONE SERVIZI | CONCLUSI | Termini NON rispettati | Concluso |
| 4 | M1 | B51F22003050006 | PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)*TERRITORIO COMUNALE*NOTIFICHE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA*NOTIFICHE VIOLAZIONI EXTRA CODICE DELLA STRADA | CONCLUSI | Termini rispettati | Concluso |
| 5 | M1 | B51F22005660006 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)*TERRITORIO NAZIONALE*EROGAZIONE API 1EROGAZIONE API 2EROGAZIONE API 3EROGAZIONE API 4EROGAZIONE API 5 | CONCLUSI | Termini NON rispettati | Concluso |
| 6 | M1 | B59I22003570006 | COMUNE DI MONZA - MUSEI CIVICI DI MONZAVIA TEODOLINDA 4MONZA*VIA TEODOLINDA 4*INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA PIENA ACCESSIBILITÀ FISICA, COGNITIVA E SENSORIALE DEL MUSEO ED ASSICURARNE LA FRUIZIONE IN AUTONOMIA | ESECUZIONE LAVORI/FORNITURA | Termini rispettati | In Corso |
| 7 | M2 | B50A22000000001 | INFRASTRUTTURE DI RICARICA BUS PNRR*VIA TERRITORIO COMUNALE*INFRASTRUTTURE DI RICARICA BUS PNRR | STIPULA CONTRATTO | Termini rispettati | In Corso |
| 8 | M2 | B50I22000000001 | FORNITURA BUS ELETTRICI NELL'AMBITO DEL PNRR*VIA TERRITORIO COMUNALE*BUS ELETTRICI | STIPULA CONTRATTO | Termini rispettati | In Corso |
| 9 | M2 | B59J21019150001 | Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato | STIPULA CONTRATTO | Termini rispettati | In Corso |
| 10 | M5 | B14H22000830006 | AMBITO TERRITORIALE DI MONZA (COMUNI DI MONZA, BRUGHERIO E VILLASANTA). COMUNE DI MONZA QUALE ENTE CAPOFILIA: VIA GUARENTI 2, 20900, MONZA (MB)*MONZA*REALIZZAZIONE DI CENTRI SERVIZI (STAZIONI DI POSTA) PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'. | AVVIO | Termini rispettati | In Corso |
| 11 | M5 | B52H22003590006 | CENTRO NATATORIO PIA GRANDE*VIA MURRI*RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA E SOLARIUM CENTRO NATATORIO PIA GRANDE | STIPULA CONTRATTO | Termini rispettati | In Corso |
| 12 | M5 | B54H22001660006 | HOUSING FIRST VIA LISSONI. REALIZZAZIONE NUOVA EDIFICAZIONE PER ATTUAZIONE DI PROGETTO*VIA LISSONI*CREARE UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE E I NUCLEI IN CONDIZIONE DI ELEVATA MARGINALITÀ SOCIALE PER LE QUALI SI ATTIVA UN PERCORSO DI AUTONOMIA | AVVIO | Termini rispettati | In Corso |
| 13 | M5 | B54H22001730006 | COMUNE DI MONZA*INTERO TERRITORIO COMUNALE*SERVIZI AFFERENTI ALLA COSTRUZIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DI VITA PER PERSONE CON DISABILITA' | STIPULA CONTRATTO | Termini rispettati | In Corso |

| N. | MISSIONE | CUP | DENOMINAZIONE PROGETTO | FASE PROCEDURALE (elaborazione CdC da Tabella PNRR al 30 giugno 2024) | Cronoprogramma rispettato (da Tabella PNRR al 30 giugno 2024) | CONCLUSO/ IN CORSO (da ReGiS al 30 gennaio 2025) |
|----|----------|-----------------|--|---|---|--|
| 14 | M5 | B55B22000160006 | CENTRO SPORTIVO CHIOLO - PIOLTELLI*VIA ROSMINI*RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO CHIOLO-PIOLTELLI DI VIA ROSMINI | STIPULA CONTRATTO | Termini rispettati | In Corso |
| 15 | M5 | B59J21026160005 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BRAMANTE*VIA BRAMANTE DA URBINO*PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE BRAMANTE | AGGIUDICAZIONE | Termini rispettati | In Corso |
| 16 | M5 | B74H21000070001 | AMBITO TERRITORIALE DI MONZACOMUNE DI MONZA, QUALE ENTE CAPOFILA. VIA GUARENTI,2 - 20900 MONZA (MB)*MONZA E BRIANZA COHESION ' STRATEGIC ASSESMENT: LINEA DI INTERVENTO AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. TRA LE AZIONI CHE SI VORREBBERO | STIPULA CONTRATTO | Termini rispettati | In Corso |
| 17 | PNC | B51F23001270001 | ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI | N.D. | Termini rispettati | Concluso |

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base della tabella PNRR e ReGiS

